



GRUPO

Mater

RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

Contratante: NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

Local: Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

Visita Técnica 01

Data vistoria: 15/10/2019


SITUAÇÃO: Escavação de vala de blocos de coroamento,





GRUPO

Mater

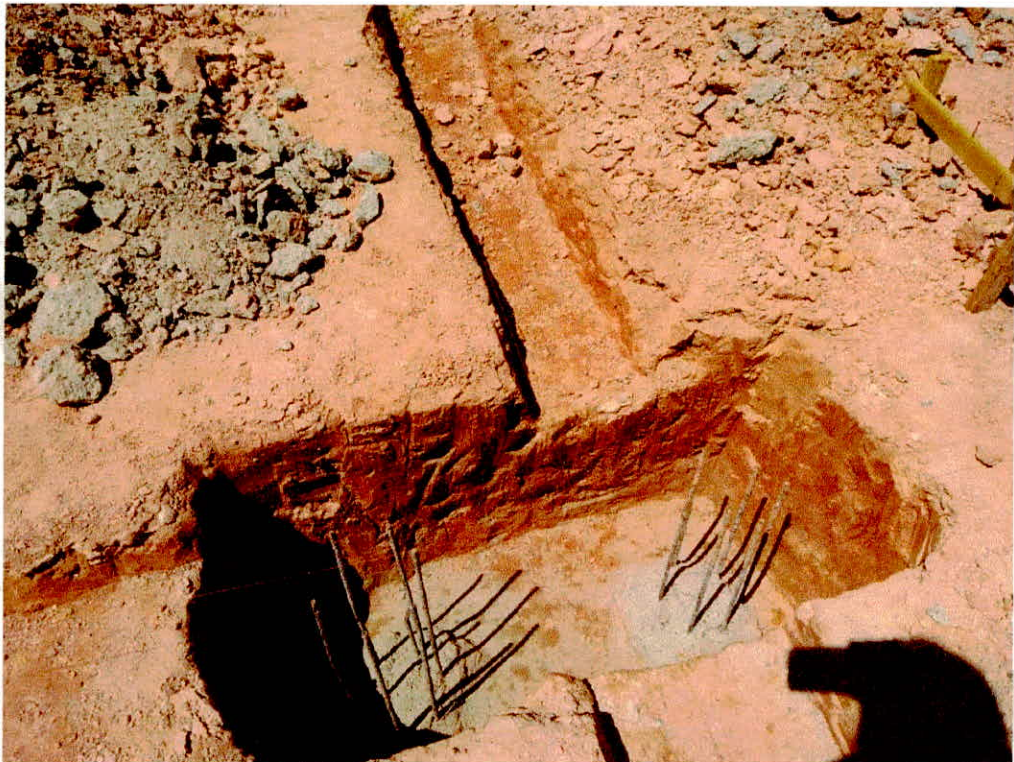



GRUPO

Mater





GRUPO

Mater


Visita Técnica 02

Data vistoria: 17/10/2019

SITUAÇÃO:

Armação dos blocos de coroamento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

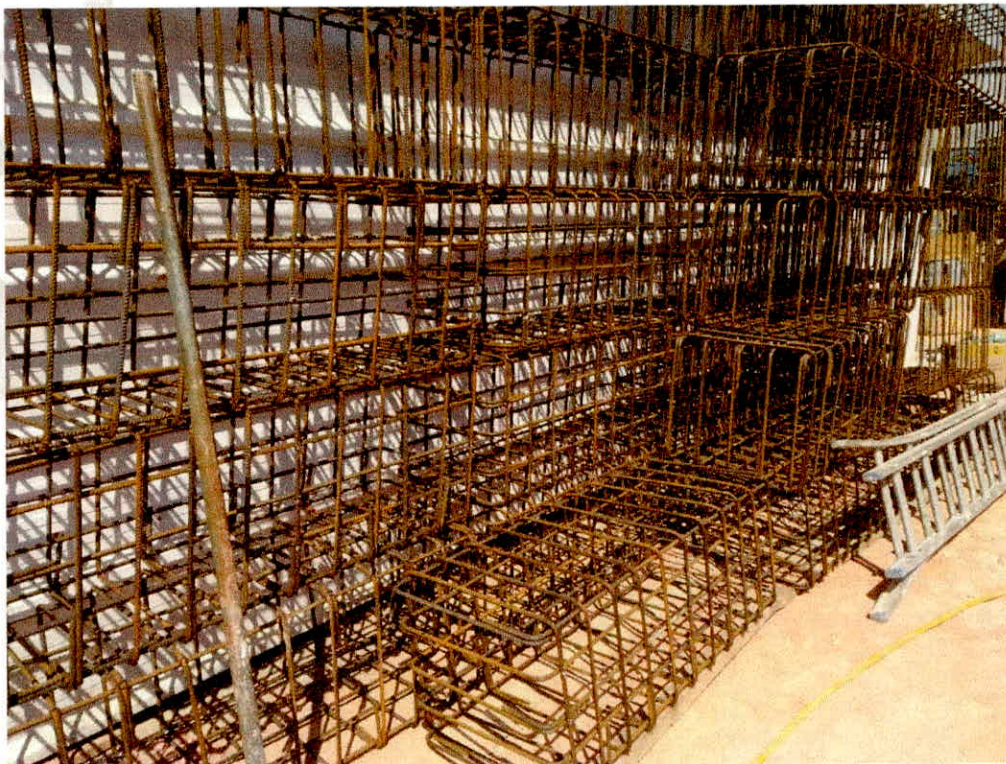



GRUPO

Mater




Visita Técnica 03

Data vistoria: 24/10/2019

SITUAÇÃO

Concretagem dos blocos de coroamento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

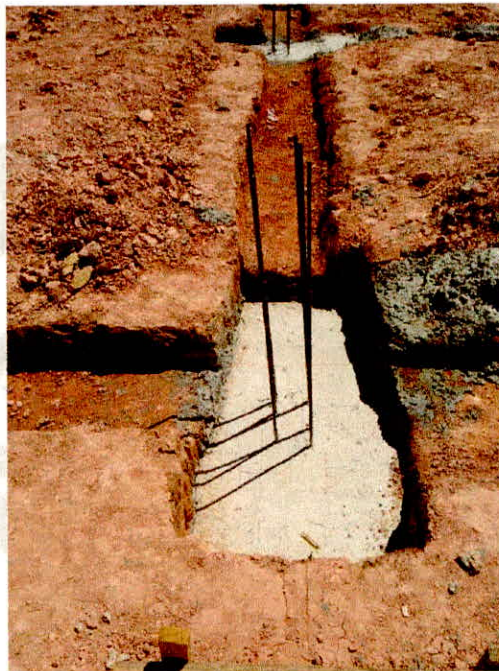



GRUPO


Mater





GRUPO

Mater

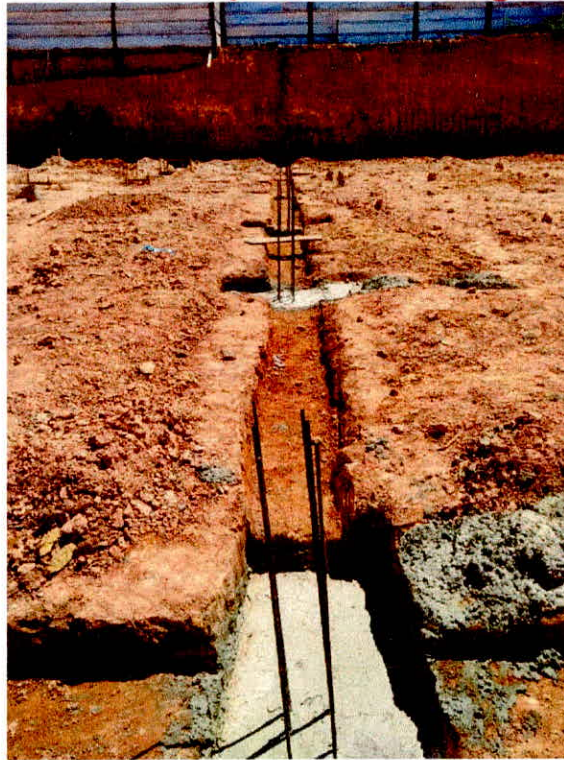

Visita Técnica 04

Data vistoria: 30/10/2019

SITUAÇÃO:

Escavação manual de vala para viga baldrame

Fabricação e montagem de formas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





GRUPO

Mater





GRUPO

Mater

OBRA: NOVA CAMARA MUNICIPAL IBAITI		Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
3.2	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 82.951,09				
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A				100,00%	12745,09
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM				100,00%	14073,13
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5				100,00%	466,14
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE				100,00%	27933,31
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE				100,00%	10430,53
3.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA				100,00%	11121,74
3.2.7	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				100,00%	6181,16
3.3	VIGA BALDRAME	R\$ 20.201,32				
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE				100,00%	6395,74
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,				100,00%	13805,58
Porcentagem			3,58%	10,73%	6,53%	6,53%
Custo			R\$ 56.583,93	R\$ 169.392,47	R\$ 103.152,41	R\$ 103.152,41
Porcentagem Acumulado			3,58%	14,31%	20,85%	14,31%
Custo Acumulado			R\$ 56.583,93	R\$ 225.976,40	R\$ 329.128,81	R\$ 329.128,81

Valor a ser liberado da 3ª Medição: R\$ 103.152,41 (Cento e três mil, cento e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavos), equivalente a 6,53%, acumulando um total de 20,85% concluído.

Carolina de Oliveira Carnasciali
Arquiteta e Urbanista

Ibaiti, 31/10/2019
