



GRUPO

*Mater*

## RELATÓRIO DE VISTORIAS DE OBRAS

**Contratante:** NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

**Local:** Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 – Centro Ibaiti-PR

**Visita Técnica 01**

**Data vistoria:** 10/09/2020

**SITUAÇÃO:** Instalação de guarda corpo e corrimão de inox, garagem de polycarbonato, portao da garagem





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*



2020/9/10 15:22



2020/9/10 15:23



GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO


*Mater*





GRUPO

*Mater*

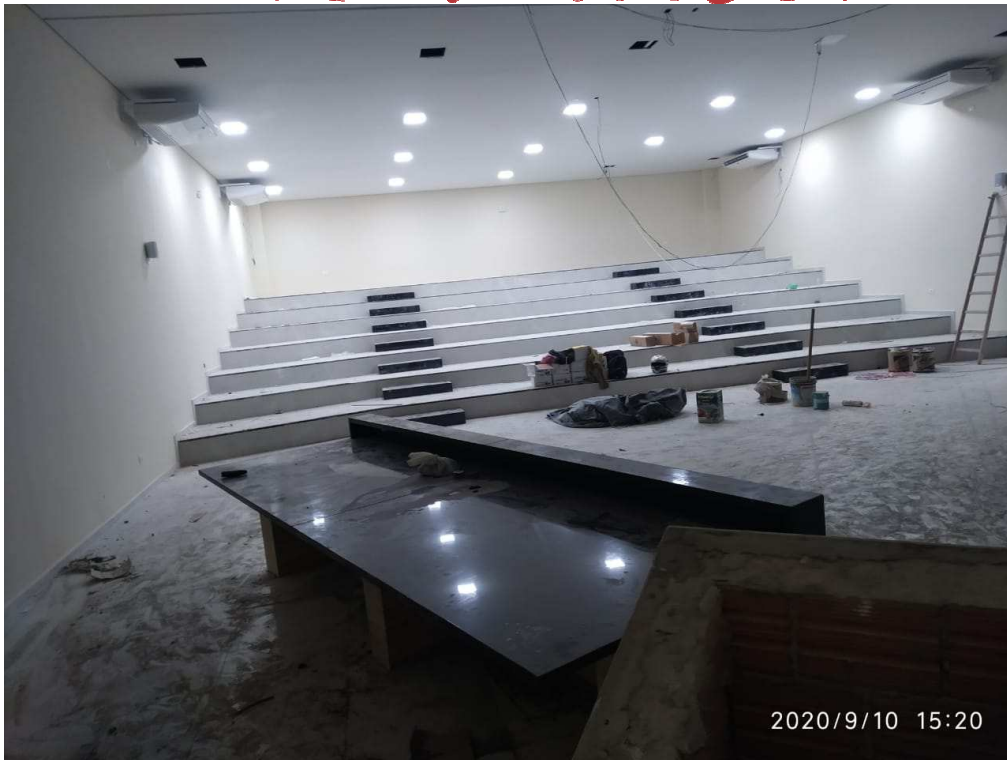





GRUPO


*Mater*





GRUPO

*Mater*

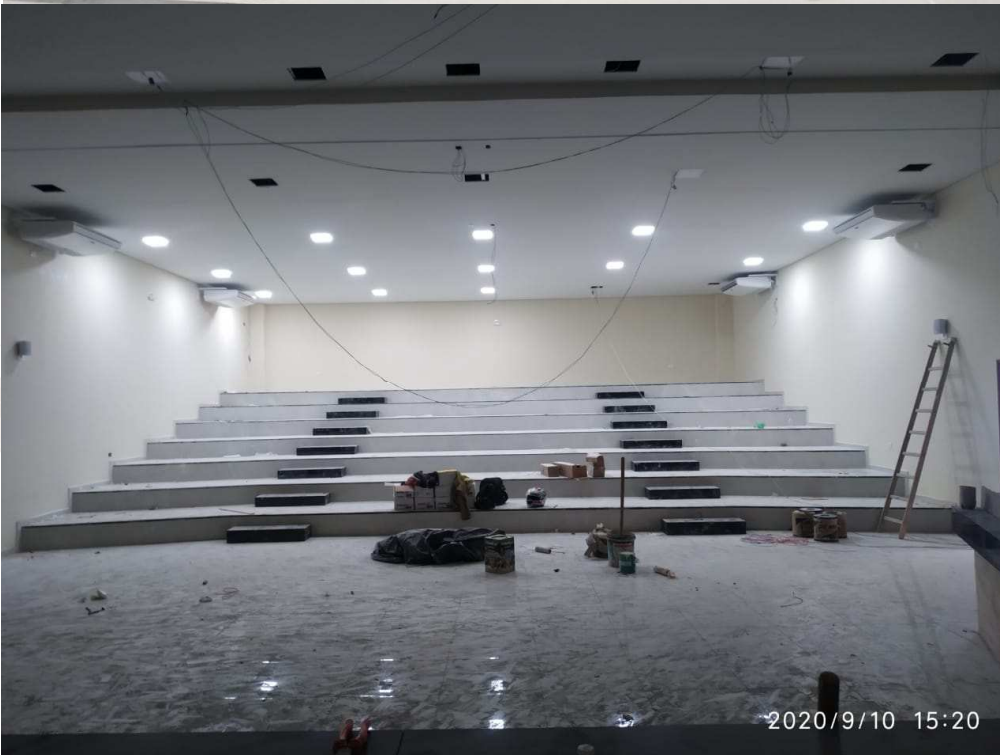



GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*



2020/9/10 15:08



2020/9/10 15:05



GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*

**Visita Técnica 02**

**Data vistoria: 24/09/2020**

**SITUAÇÃO:** Limpeza e finalização da obra







GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

*Mater*





GRUPO

Mater

TP No. 1/2019 - CMI		Obra: Nova Câmara Municipal de Ibaí (PR)		BDI - 30%	
Data: 04/07/2019		Planilha Orçamentária Sintética			
Item	Descrição	Und	Quant.		
<b>5.2 GRANITOS</b>					
5.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	130,70	R\$	2.726,69
5.2.2	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMETE EM CIMENTO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	30,09	R\$	16.723,10
5.2.3	PEITORIL EM GRANITO, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	M	51,45	R\$	4.358,79
5.2.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	1.051,46
5.2.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	481,78
5.2.6	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS (ESCADAS). AF_06/2018	m²	14,08	R\$	3.552,70
5.2.7	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM (ESCADAS). AF_06/2018	M	23,14	R\$	1.094,78
<b>5.3 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					
5.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A BASE DE SILICONE	m²	56,80	R\$	1.514,40
<b>6 PISOS E CALÇADAS</b>					
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 8CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (PRÉDIO)	m²	452,00	R\$	5.278,51
6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	309,45	R\$	1.630,46
6.3	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	m²	R\$ 187,50	R\$	14.918,85
6.4	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA	m²	20,00	R\$	9.918,50
6.5	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	un	400,00	R\$	6.879,92
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	187,53	R\$	11.189,41
<b>7 REVESTIMENTOS</b>					
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	840,00	R\$	2.255,73
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	317,66		
7.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	734,59		
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO TULINHO PARA APLICAÇÃO EM FACHADA EXTERNA	m²	56,80	R\$	9.576,75
				R\$	9.469,48
				R\$	1.253,15
				R\$	2.480,35
<b>12 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
<b>13 PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	667,22	R\$	1.357,35
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.588,52	R\$	2.568,80
<b>14 ELEMENTOS COMPLEMENTARES</b>					
<b>14.1 LOUÇAS</b>					
14.1.1	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$	1.238,82
14.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	795,35
14.1.2	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$	4.380,68
14.1.3	MICTÓRIO SFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	1.058,59
14.1.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	597,31
14.1.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$	639,44
14.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$	2.061,36
14.1.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	301,04
<b>14.2 METAIS E ACABAMENTOS</b>					
14.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	130,53
14.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	193,79
14.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	R\$	1.475,37
14.2.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO PLÁSTICO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00	R\$	1.107,33
14.2.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00	R\$	73,43
14.2.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$	105,78
14.2.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	12,00	R\$	1.476,22
14.2.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$	2.612,56
14.2.9	GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	19,00	R\$	10.432,06
14.2.10	CORRIMÃO EM AÇO INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	R\$	2.120,89
<b>15 SERVIÇOS FINAIS</b>					
15.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	46,35	R\$	322,40
15.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	50,00	R\$	2.115,32
15.6	MASTRO COM BANDEIRA COM 5 METROS	ud	3,00	R\$	1.891,79
15.7	PILARETE TUBO METÁLICO	Vb	50,00	R\$	2.667,02
15.8	PERGOLADO EM TUBO METÁLICO	Vb	150,00	R\$	8.001,05
15.9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, "45 X 18 /12" CM (H X L1/L2)	UN	83,00	R\$	2.842,46
15.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	873,00	R\$	2.547,13
<b>TOTAL GERAL COM BDI DE 30%</b>					
<b>Porcentagem</b>				10,229%	
<b>Custo</b>				R\$	161.468,68
<b>Porcentagem Acumulado</b>				100,00%	
<b>Custo Acumulado</b>				R\$	1.578.610,77



GRUPO

Mater



GRUPO

Mater

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO OBRA DA CAMARA - ADITIVOS						
1	MESAS PLENÁRIO E GABINETES	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER
	ELABORAÇÃO PROJETO DAS MESAS	LN	R\$ 525,00	70%	R\$ -	
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 674,14	70%	R\$ -	
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 1.198,58	70%	R\$ -	
4.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FOR = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF -	m²	R\$ 648,26	70%	R\$ -	
5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA, DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E	m²	R\$ 2.112,99	70%	R\$ -	
5.12	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	R\$ 185,96	70%	R\$ -	
5.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE	m²	R\$ 1.539,29	70%	R\$ -	
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	R\$ 6.082,08	70%	R\$ -	
4.27	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF. 12/2015	m²	R\$ 172,38	70%	R\$ -	
4.28	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF. 12/2015	M	R\$ -			
4.29	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/10X12 VIOS 4,40MINCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPa	m²	R\$ 559,56	70%	R\$ -	
4.212	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSSEIÁVEIS, COM CONCRETO TALPO EM GRANITO OURO BRASL, ESPESURA 8CM	m2	R\$ 13.124,13	70%	R\$ -	
	TUBO QUADRADO 10 X 5 PINTADO DE DOURADO	M	R\$ 1.199,69	70%	R\$ -	

2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER
	HW12CRELH2ECOIN - HI WALL 12.000 BTU'S CR ELGIN INVERTER R410 - A HORIZ 220 V	UND	R\$ 32.012,82	70%	R\$ -	
	HW18CRELH2ECOIN - HI WALL 18.000 BTU'S CR ELGIN INVERTER R410 - A HORIZ 220 V	UND	R\$ 2.630,88	70%	R\$ -	
	HW24CRELH2ECOIN - HI WALL 24.000 BTU'S CR ELGIN INVERTER R410 - A HORIZ 220 V	UND	R\$ 9.707,04	70%	R\$ -	
	PT29CRLGHNV2 - TETO 29.000 CRLG 220V INVERTER	UND	R\$ 43.035,30	70%	R\$ -	
	FLUIDO REF R410A ONU3 R53/2/2 11,35KG CHEMOURS	KG	R\$ 908,90	70%	R\$ -	
	CANO COBRE BOB 1/32 06,35 1/4 0,123 II	KG	R\$ 868,31	70%	R\$ -	
	CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 I	KG	R\$ 363,36	70%	R\$ -	
	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 II	KG	R\$ 1.414,91	70%	R\$ -	
	CANO COBRE BOB 1/32 15,87 5/8 0,333 I	KG	R\$ 1.576,93	70%	R\$ -	
	ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 3/8	MT	R\$ 136,08	70%	R\$ -	
	ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 1/4	MT	R\$ 604,80	70%	R\$ -	
	ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 5/8	MT	R\$ 159,89	70%	R\$ -	
	ISOLANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO 1/2	MT	R\$ 406,35	70%	R\$ -	
	SUPORTE SPLIT 400X400 12.000 1,2MM	PC	R\$ 285,43	70%	R\$ -	
	SUPORTE SPLIT 500X500 12 A 30.000 1,2MM	PC	R\$ 132,16	70%	R\$ -	
	SUPORTE SPLIT 600X500 18 A 48.000 1,8MM	PC	R\$ 315,54	70%	R\$ -	
	SUPORTE SPLIT EVAP 600X230X200 30 A 80.000 1,8MM	PC	R\$ 250,95	70%	R\$ -	
	CAIXA PASSAGEM SPLIT REVER 29X17X5CM DR. HORIZ. POLAR/POP	PC	R\$ 115,10	70%	R\$ -	
	CAIXA PASSAGEM SPLIT 39X17X7CM CONDENSADORA	PC	R\$ 96,33	70%	R\$ -	
	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	CJ	R\$ 15.925,00	70%	R\$ -	



GRUPO

Mater

3	SERVIÇOS GERAIS E DIVERGÊNCIAS PROJETO	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER
825	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	R\$ 2.071,38	70%	R\$ -	
3.14	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM.	KG	R\$ 742,57	70%	R\$ -	
3.16	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	R\$ 4.051,98	70%	R\$ -	
3.17	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	R\$ 10.574,37	70%	R\$ -	
3.35	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 1.168,75	70%	R\$ -	
3.34	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG			R\$ -	
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 1.370,87	70%	R\$ -	
4.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG			R\$ -	
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 1.877,77	70%	R\$ -	
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO	KG	R\$ 2.503,73	70%	R\$ -	
	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	R\$ 5.714,94	70%	R\$ -	
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM	m²	R\$ 1.976,07	70%	R\$ -	
13.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	R\$ 4.060,97	70%	R\$ -	
13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	R\$ 2.521,83	70%	R\$ -	
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.150,55	70%	R\$ -	
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 4.562,84	70%	R\$ -	
	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.464,71	70%	R\$ -	
	ALIZAR (VISTA OU GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	R\$ 798,28	70%	R\$ -	
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 1.303,30	70%	R\$ -	
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 2.087,40	70%	R\$ -	
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	R\$ 23.716,85	70%	R\$ -	
	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	R\$ 2.061,13	70%	R\$ -	
5.14	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS	m²	R\$ 1.167,89	70%	R\$ -	
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	R\$ 2.200,79	70%	R\$ -	
	REVESTIMENTO EM ACM PAINEL - ESTRUTURA ALUMÍNIO	m²			R\$ -	
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	R\$ 11.484,38	100%	R\$ -	
5.22	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSE	m²	R\$ 8.582,57	100%	R\$ -	
5.24	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAV	m²	R\$ 539,64	100%	R\$ -	
5.25	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE	m²	R\$ 247,26	100%	R\$ -	
5.26	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTER	m²	R\$ 1.823,29	100%	R\$ -	
5.27	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM (ESCADAS), A	m	R\$ 561,84	100%	R\$ -	
			R\$ -			





GRUPO

Mater


4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER	
	DESCRIÇÃO DE ITENS - PLANILHA ANEXA	LN	R\$ 28.066,73	70%	R\$ -		CUSTO APRESENTADO PELA CONSTRUTORA
5	ARQUIBANCADA PLENÁRIO	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER	
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 1.465,65	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	KG	R\$ 7.493,81	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRAUDO UTILIZANDO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²	KG	R\$ 1.549,08	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
4.15	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM, AF. 12/20 15	m³	R\$ 4.537,79	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
4.2.7	SUPOORTE DE FERRO PARA CALHA 80 CM - DIVISA COM FORUM (VÃO EM FUNÇÃO DO PROJETO)	LN	R\$ 531,30	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
8.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/20 16	M	R\$ 1.192,86	70%	R\$ -		ITEM NÃO ORÇADO
	REVESTIMENTO DE ESCADA ACABAMENTO 45 GRAUS PREGO SÃO GABRIEL, DAÍCOLCOCA POR UNIDADE 14 DEGRAUS	PÇ	R\$ 5.786,87	70%	R\$ -		DEGRAUS DA ARQUIBANCADA NÃO FOI FEITO COM 15 CM E SM COM 7 CM
6	GARAGEM CONFORME PROJETO	UNIDADE	EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER	
5.1	Execução de estruturas Metálicas, Portão e Cobertura em policarbonato - Conforme novo projeto fornecido	Q			R\$ 12.500,00		

	GLOSAS		EXECUTADO	% EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	GLOSAS VR A ABATER	
3.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		-100%		R\$ 10,60	DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DO ORÇAMENTO E PROJETO
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		-100%		R\$ 212,04	DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DO ORÇAMENTO E PROJETO
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		-100%		R\$ 77,10	DIFERENÇA DE QUANTITATIVO DO ORÇAMENTO E PROJETO
15.7	PILARETE TUBO METÁLICO	Vb		-100%		R\$ 2.737,50	MUDANÇA DE PROJETO DA GARAGEM PARA SEGURANÇA
15.8	PERGOLADO EM TUBO METÁLICO	Vb		-100%		R\$ 8.212,50	MUDANÇA DE PROJETO DA GARAGEM PARA SEGURANÇA
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO TIJOLINHO PARA APLICAÇÃO EM FACHADA EXTERNA	m²		-100%		R\$ 9.829,81	MUDANÇA DO REVESTIMENTO DA FACHADA
5.2.2	DIVISÓRIA EM GRANITO, POLIDO, ESP = 3CM	m²		-100%		R\$ 17.165,14	A DIFERENÇA SE DEVE A UTILIZAR O GRANITO CINZA QUE É 50% MAIS BARATO
5.2.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PAR	m²		-100%		R\$ 1.079,28	A DIFERENÇA SE DEVE A UTILIZAR O GRANITO CINZA QUE É 50% MAIS BARATO
5.2.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PAR	m²		-100%		R\$ 494,52	A DIFERENÇA SE DEVE A UTILIZAR O GRANITO CINZA QUE É 50% MAIS BARATO
5.2.6	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTE	m²		-100%		R\$ 3.646,58	A DIFERENÇA SE DEVE A UTILIZAR O GRANITO CINZA QUE É 50% MAIS BARATO
5.2.7	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM (ESC.	m		-100%		R\$ 1.123,68	A DIFERENÇA SE DEVE A UTILIZAR O GRANITO CINZA QUE É 50% MAIS BARATO
6.3	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DREN	m2		-100%		R\$ 15.313,13	SUBSTITUÍDO O PISO DRENANTE POR PAVER
5.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ES	ML		-100%		R\$ 2.234,19	REFERENTE DIMINUIÇÃO DA LARGURA DOS FILETES DA ESCADA
5.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A BA	m2		-100%		R\$ 1.554,62	NÃO FOI EXECUTADO A FACHADA DE TIJOLINHO
VALOR			R\$ -	-100%		R\$ -	

TOTAL GERAL

R\$ 296.521,05

R\$ 63.690,68

VALOR TOTAL DO ADITIVO	R\$	381.681,78	100%	(Trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais, setenta e oito centavos)
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO/MEDIÇÃO ANTERIOR	R\$	136.351,41	35,72%	
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO	R\$	296.521,05	77,69%	
VALOR DAS GLOSAS	R\$	63.690,68		
TOTAL A RECEBER 14ª MEDIÇÃO	R\$	232.830,37	61,00%	(Duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais, sessenta e sete centavos)
				
CAROLINA OLIVEIRA CARNASCIALI				
ARQUITETA URBANISTA				
CAU-A 37-523-3				



GRUPO

*Mater*

*Valor a ser liberado da 14ª Medição:*

*R\$ 161.468,69 (Cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos) equivalente a 10,791%, totalizando 100% concluído da planilha principal.*

*R\$ 232.830,37(Duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta reais, trinta e sete centavos) equivalente a 61%, totalizando 96,73% concluído da planilha de aditivos.*

**Valor total a pagar de:**

**R\$ 394.299,06(Trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais, e seis centavos)**

*Carnasciali*

*Carolina de Oliveira Carnasciali  
Arquiteta e Urbanista*

*Ibaiti, 24/09/2020*
